




KREDITU × ATOM

Volver a generar valor en la operación de Kreditu

Plan de acción a 40 días

Bautista Tolloni · Customer Success Manager

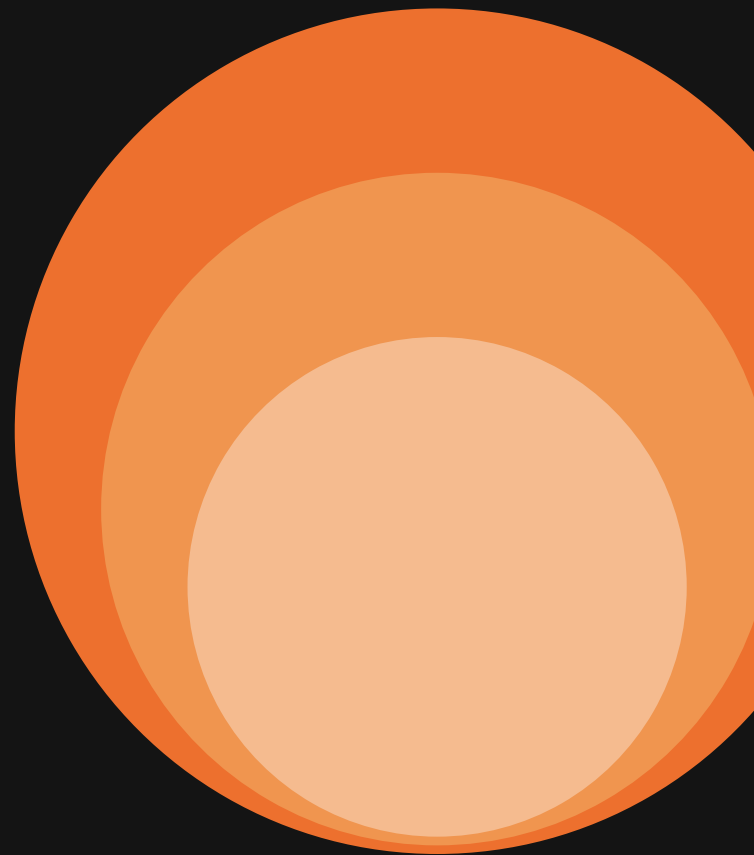

Situación actual de la cuenta



No es solo un problema de adopción: también es de operación y de confianza

ADOPCIÓN

41%

automatización (75%
contratado)

3 / 12

flujos activos

18 / 60

agentes activos

+

OPERACIÓN

2

quejas formales por tasas

38

tickets al mes

3,4 / 5

CSAT de las
conversaciones

+

CONTINUIDAD

2

sesiones de CS en 7
meses

2 meses

sin CSM asignado

3

coordinadores en 7
meses



RESULTADO


**Pérdida de
confianza
en la
herramienta**

Diagnóstico de la cuenta



En 40 días no activamos 12 flujos: resolvemos lo que más afecta el valor y la confianza

CAUSA RAÍZ		DÓNDE SE RESUELVE	
1	Implementación simultánea de 12 flujos sin priorización	→	Foco en 3 frentes
2	Tasas sin una fuente única de información	→	Frente 1: Tasas
3	Flujo de cobros sin configuración funcional	→	Frente 2: Cobros
4	Integración de scoring sin responsable definido	→	Frente 2: Cobros
5	Pérdida de conocimiento por rotación de coordinadores	→	Frente 3: Continuidad



Modelo de trabajo



Un responsable que coordina a todos los actores




Seguimiento semanal: reunión de 30 minutos y reporte de avance

Frente 1: Tasas de interés



Semana 1: es la prioridad porque ya afecta a sus clientes

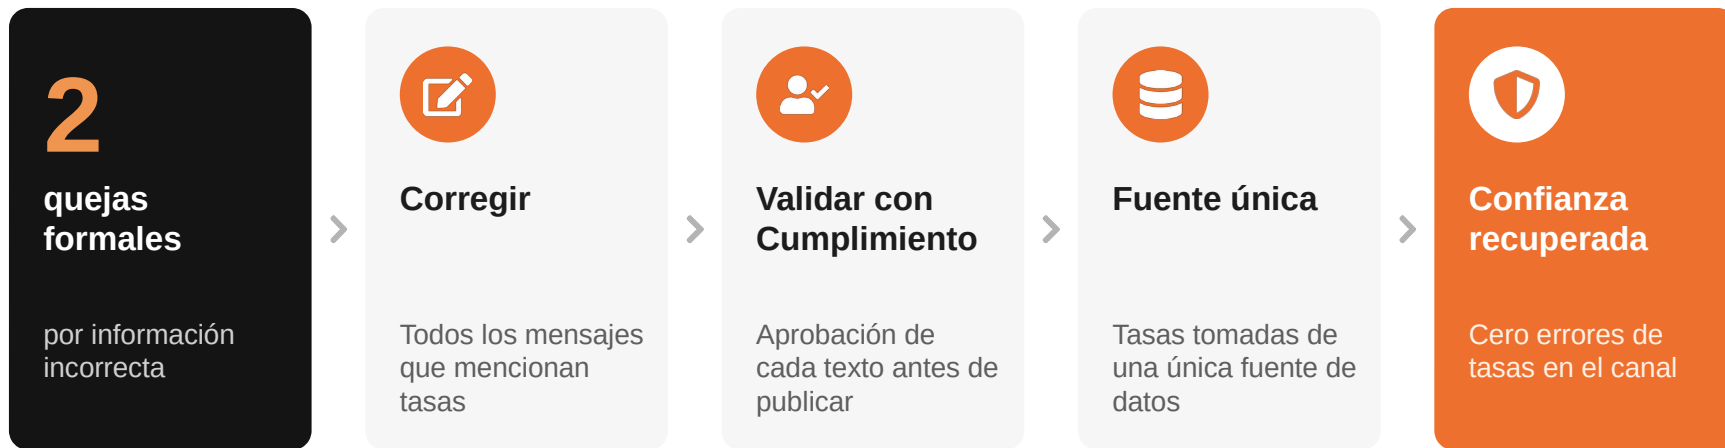

FECHA

Semana 1

ENTREGABLE

100% de los mensajes con tasas corregidos y validados

NECESITAMOS DE KREDITU

Tasas vigentes y contacto de Cumplimiento

Frente 2: Cobros



Semanas 1 a 4: no esperamos la API para empezar a generar valor

ALTERNATIVA TEMPORAL



FECHA

Semana 4

ENTREGABLE

Flujo de cobros funcionando con clientes reales

NECESITAMOS DE KREDITU

Archivo de cartera y sesión con Sistemas

Frente 3: Continuidad operativa



Semanas 1 a 5

3 coordinadores en 7 meses

El conocimiento tiene que quedar en la operación, no en una persona.



Responsable y suplente



Manual de cada flujo



Preguntas frecuentes desde los tickets



Capacitación a nuevos coordinadores



Videos por flujo



Registro de cambios

FECHA

Semana 5

ENTREGABLE

Manual y preguntas frecuentes publicados, equipo capacitado

NECESITAMOS DE KREDITU

Nombres del responsable y del suplente

Indicadores de éxito a 40 días



Tres dimensiones, no solo automatización

ADOPCIÓN

Automatización

41% → **55%**

75% a 6 meses

Flujo de cobros

No funciona → **Con clientes reales**

OPERACIÓN

Errores de tasas

2 quejas → **0 en 30 días**

Tickets al mes

38 → **Menos de 20**

Mora de la cartera contactada

Sin medición → **Medida desde sem. 4**

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

CSAT de las conversaciones

3,4 → **4,0**

4,5 a 6 meses

En estos 40 días quiero recuperar evidencia concreta de que ATOM está generando valor para Kreditu antes de la renovación.

Para empezar, necesito de Kreditu:



**Responsable y
suplente**



**Sesión técnica con
Sistemas**



Archivo de cartera



**Tasas vigentes y
contacto de
Cumplimiento**
